# EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK

## WEBSITE UMKM BAKSO JAMBO LANGSA

### KELOMPOK 4

**Anggota Kelompok:**

1. Rani Simahbengi
2. Anisa Aulia
3. Zaskia Lexsa
4. M. Rizki Foenna

Periode evaluasi: sampai dengan 28 November 2026

Repository: https://github.com/MPPL01022026/kelompok-4

Dokumen perencanaan: Lark Base – Project Planning Kelompok 4

## 1. Pendahuluan

Evaluasi pelaksanaan proyek dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengembangan Website UMKM Bakso Jambo Langsa. Evaluasi mencakup jadwal, penggunaan tenaga kerja (manday), anggaran, kendala, perubahan ruang lingkup, serta tindakan korektif yang diperlukan.

Dokumen ini disusun berdasarkan data perencanaan yang telah dibuat pada Project Planning dan bukti aktivitas repository GitHub yang telah dibagikan. Karena catatan timesheet dan bukti pengeluaran aktual belum tersedia pada bahan yang dapat diperiksa, angka aktual yang tidak memiliki bukti tidak dibuat-buat dan ditandai sebagai belum tercatat.

## 2. Perbandingan Rencana dengan Realisasi Waktu

Berdasarkan perencanaan proyek, periode pelaksanaan direncanakan berlangsung pada 21 Oktober sampai 28 November 2026. Pada tanggal evaluasi 13 November 2026, proyek masih berada dalam periode pelaksanaan yang direncanakan. Repository GitHub telah menunjukkan aktivitas pengembangan, tetapi aktivitas commit saja belum cukup untuk menetapkan bahwa setiap pekerjaan pada Gantt Schedule telah selesai tepat waktu.

| Aspek | Rencana | Realisasi/Bukti yang tersedia | Evaluasi |
|---|---|---|---|
| Periode proyek | 21 Okt–28 Nov 2026 | Evaluasi dilakukan 9 Nov 2026; proyek masih dalam rentang rencana | Belum melewati batas akhir jadwal |
| Analisis kebutuhan | Mengikuti Gantt Schedule | Status penyelesaian per aktivitas belum dapat | Perlu dicocokkan dengan status di Lark |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | diverifikasi dari data yang tersedia | |
| Perancangan sistem/UI | Mengikuti Gantt Schedule | Belum ada tanggal realisasi terverifikasi | Perlu dicocokkan dengan status di Lark |
| Pengembangan website | Mengikuti Gantt Schedule | Repository berisi file pengembangan dan riwayat commit | Pengembangan telah memiliki bukti aktivitas |
| Pengujian dan penyelesaian | Sesuai jadwal sampai 28 Nov 2026 | Belum ada bukti penyelesaian final yang dapat dipastikan | Masih perlu dipantau |

Kesimpulan waktu: sampai dengan 13 November 2026, proyek masih berada dalam periode jadwal yang direncanakan. Penilaian tepat waktu atau terlambat untuk masing-masing aktivitas harus ditentukan dengan membandingkan tanggal Mulai dan Selesai pada Gantt Schedule dengan tanggal realisasi sebenarnya.

## 3. Perbandingan Estimasi Manday dengan Manday Aktual

Estimasi kebutuhan tenaga kerja pada dokumen perencanaan adalah 15,75 mandays. Satu manday diasumsikan setara dengan 8 jam kerja. Manday aktual seharusnya dihitung dari total jam kerja yang benar-benar dicatat oleh seluruh anggota kelompok, kemudian dibagi 8.

| **Komponen** | **Nilai** | **Keterangan** |
|---|---|---|
| Estimasi manday | 15,75 mandays | Berdasarkan perencanaan |
| Manday aktual | Belum tercatat | Belum tersedia timesheet/jam kerja aktual tiap anggota |
| Selisih manday | Belum dapat dihitung | Manday aktual dikurangi estimasi |

## 5. Perbandingan Anggaran dengan Biaya Aktual

Anggaran pada Project Planning merupakan simulasi estimasi biaya. Nilai tersebut tidak otomatis menjadi pengeluaran aktual proyek.

| **Komponen** | **Anggaran** | **Biaya aktual** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|
| Tenaga kerja | Rp1.575.000 | Belum tercatat | Simulasi 15,75 mandays × Rp100.000 |
| Hosting/database | Rp0 | Rp0 / belum ada bukti biaya | Perencanaan menggunakan layanan gratis |
| Perangkat kerja | Rp0 | Rp0 / belum ada bukti biaya | Menggunakan perangkat pribadi |
| Biaya tambahan/overhead 10% | Rp157.500 | Belum tercatat | Cadangan estimasi, bukan pengeluaran otomatis |
| **TOTAL** | **Rp1.732.500** | **Belum dapat ditetapkan** | **Menunggu bukti transaksi/pengeluaran aktual** |

Kesimpulan biaya: total anggaran rencana adalah Rp1.732.500. Biaya aktual belum dapat dibandingkan secara numerik karena belum ada catatan transaksi atau pengeluaran yang diserahkan. Jika selama proyek tidak ada pengeluaran tunai, biaya aktual dapat dicatat Rp0 dengan keterangan bahwa tenaga kerja merupakan estimasi/simulasi dan perangkat menggunakan fasilitas pribadi.

## 6. Daftar Masalah, Perubahan Ruang Lingkup, dan Tindakan Korektif

| No. | Masalah/kendala yang perlu dipantau | Perubahan ruang lingkup | Tindakan korektif |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelengkapan informasi UMKM (menu, harga, lokasi, kontak) perlu dipastikan. | Belum ada perubahan ruang lingkup yang terkonfirmasi. | Memvalidasi informasi kepada pihak UMKM sebelum dipublikasikan. |
| 2 | Tampilan website dapat memerlukan penyesuaian selama proses pengembangan. | Penyesuaian tampilan tetap berada dalam tujuan website profil/promosi UMKM. | Melakukan revisi UI dan memeriksa konsistensi tampilan. |
| 3 | Potensi kesalahan kode atau integrasi antarberkas. | Belum ada perubahan ruang lingkup yang terkonfirmasi. | Melakukan pengujian tiap fitur, memperbaiki error, dan menyimpan perubahan melalui GitHub. |
| 4 | Koordinasi dan sinkronisasi pekerjaan antaranggota perlu dijaga. | Tidak mengubah ruang lingkup proyek. | Memperbarui progres secara berkala dan menyepakati pekerjaan berikutnya. |
| 5 | Manday aktual dan biaya aktual belum terdokumentasi secara rinci. | Tidak mengubah ruang lingkup proyek. | Mencatat jam kerja setiap anggota serta setiap pengeluaran disertai bukti. |

Catatan: daftar di atas memuat hal-hal yang perlu dikendalikan dan diverifikasi selama pelaksanaan. Butir tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian faktual apabila tidak benar-benar dialami oleh tim. Jika tidak ada perubahan ruang lingkup, tuliskan bahwa ruang lingkup tetap sesuai rencana.

## 7. Bukti Progres dan Kolaborasi GitHub

Repository kelompok digunakan sebagai tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi proyek. Berdasarkan pemeriksaan repository yang telah dilakukan pada saat penyusunan evaluasi, tersedia aktivitas commit serta berkas pengembangan website, antara lain index.html, style.css, app.js, dan supabase.js. Dokumentasi perencanaan juga disimpan di repository.

Tautan repository: https://github.com/MPPL01022026/kelompok-4


Bukti yang disarankan untuk dilampirkan: tangkapan layar halaman utama repository, riwayat commits, daftar berkas kode, dan tampilan website/prototipe yang sedang dikembangkan. Riwayat commit merupakan bukti aktivitas perubahan kode, bukan ukuran langsung bahwa seluruh fitur telah selesai.

## 8. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Secara umum, proyek Website UMKM Bakso Jambo Langsa telah memasuki tahap pelaksanaan dan memiliki bukti aktivitas pengembangan melalui repository GitHub. Pada tanggal evaluasi 13 November 2026, periode proyek masih berada dalam rentang jadwal yang direncanakan, yaitu sampai 28 November 2026. Namun, kesesuaian waktu per aktivitas belum dapat dipastikan tanpa pencocokan dengan realisasi pada Gantt Schedule.


Estimasi tenaga kerja sebesar 15,75 mandays dan estimasi anggaran sebesar Rp1.732.500 telah tersedia dari tahap perencanaan. Manday dan biaya aktual masih perlu dicatat berdasarkan jam kerja dan pengeluaran yang benar-benar terjadi. Tindak lanjut utama adalah memperbarui status aktivitas di Lark Base, mencatat jam kerja anggota, mendokumentasikan biaya aktual, melakukan pengujian website, serta mencatat setiap kendala dan perubahan ruang lingkup secara nyata.

## 9. Lampiran Evaluasi

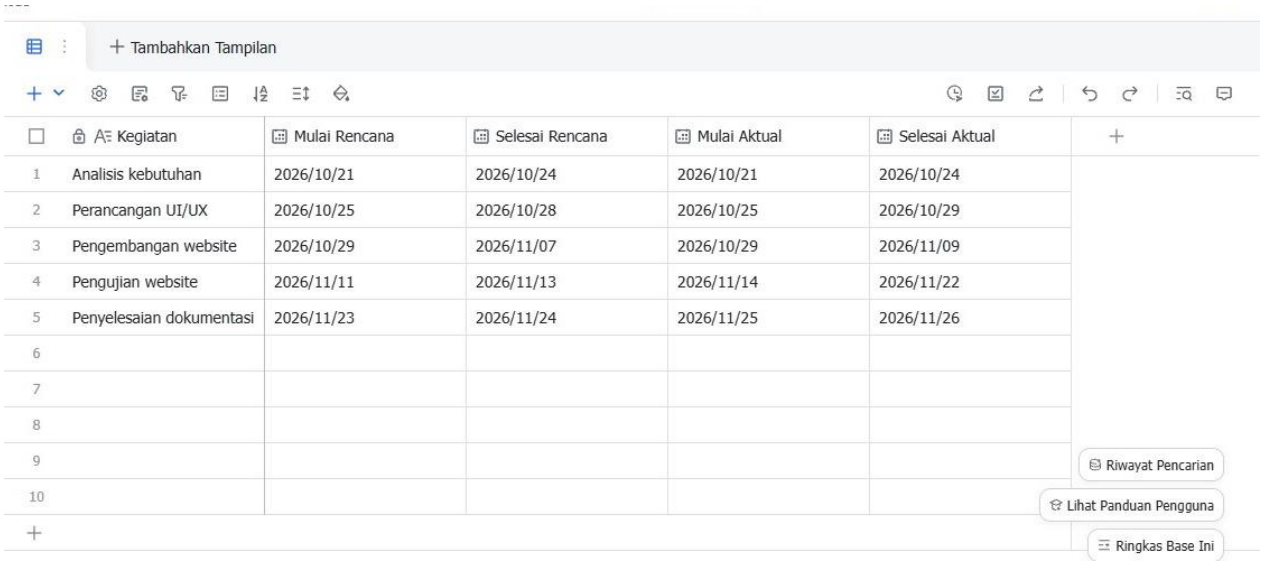



| | Kegiatan | Mulai Rencana | Selesai Rencana | Mulai Aktual | Selesai Aktual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis kebutuhan | 2026/10/21 | 2026/10/24 | 2026/10/21 | 2026/10/24 |
| 2 | Perancangan UI/UX | 2026/10/25 | 2026/10/28 | 2026/10/25 | 2026/10/29 |
| 3 | Pengembangan website | 2026/10/29 | 2026/11/07 | 2026/10/29 | 2026/11/09 |
| 4 | Pengujian website | 2026/11/11 | 2026/11/13 | 2026/11/14 | 2026/11/22 |
| 5 | Penyelesaian dokumentasi | 2026/11/23 | 2026/11/24 | 2026/11/25 | 2026/11/26 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Gambar 1. Evaluasi Jadwal

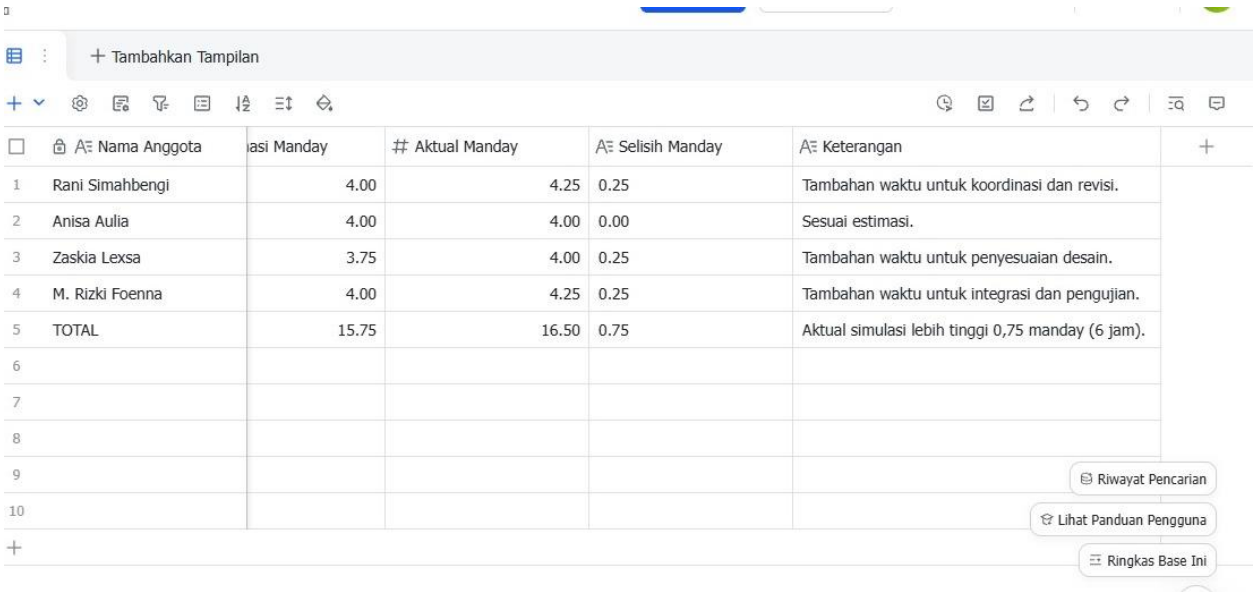


| | Nama Anggota | asi Manday | Aktual Manday | Selisih Manday | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani Simahbengi | 4.00 | 4.25 | 0.25 | Tambahan waktu untuk koordinasi dan revisi. |
| 2 | Anisa Aulia | 4.00 | 4.00 | 0.00 | Sesuai estimasi. |
| 3 | Zaskia Lexsa | 3.75 | 4.00 | 0.25 | Tambahan waktu untuk penyesuaian desain. |
| 4 | M. Rizki Foenna | 4.00 | 4.25 | 0.25 | Tambahan waktu untuk integrasi dan pengujian. |
| 5 | TOTAL | 15.75 | 16.50 | 0.75 | Aktual simulasi lebih tinggi 0,75 manday (6 jam). |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |


Gambar 2. Evaluasi Manday

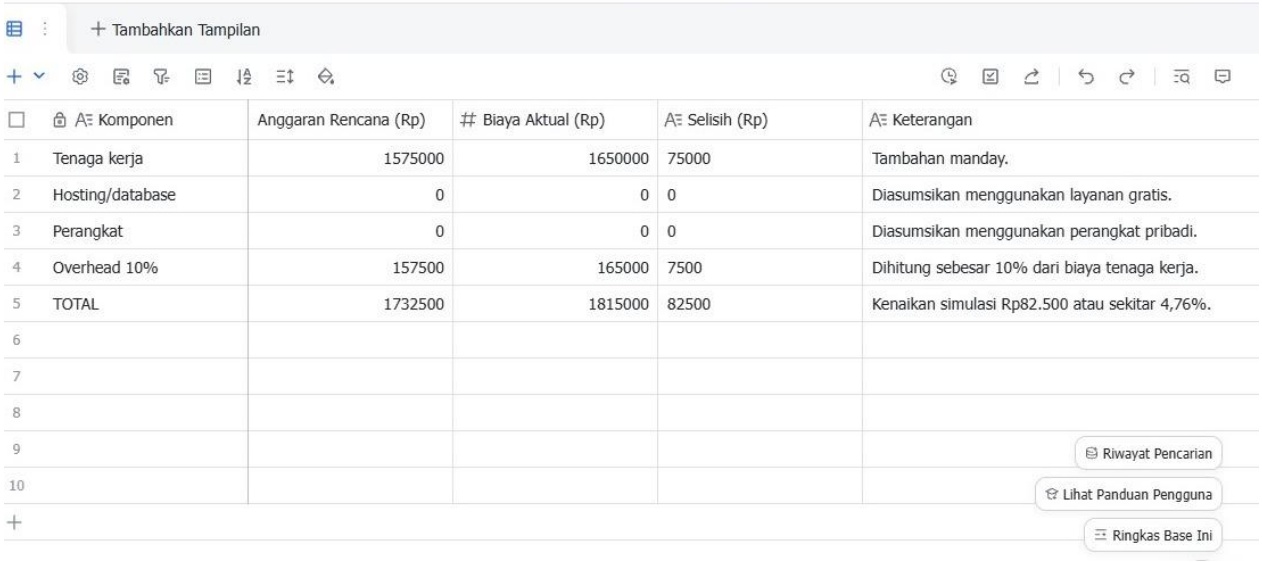

| | Komponen | Anggaran Rencana (Rp) | Biaya Aktual (Rp) | Selisih (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenaga kerja | 1575000 | 1650000 | 75000 | Tambahan manday. |
| 2 | Hosting/database | 0 | 0 | 0 | Diasumsikan menggunakan layanan gratis. |
| 3 | Perangkat | 0 | 0 | 0 | Diasumsikan menggunakan perangkat pribadi. |
| 4 | Overhead 10% | 157500 | 165000 | 7500 | Dihitung sebesar 10% dari biaya tenaga kerja. |
| 5 | TOTAL | 1732500 | 1815000 | 82500 | Kenaikan simulasi Rp82.500 atau sekitar 4,76%. |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |




Gambar 3. Evaluasi Anggaran

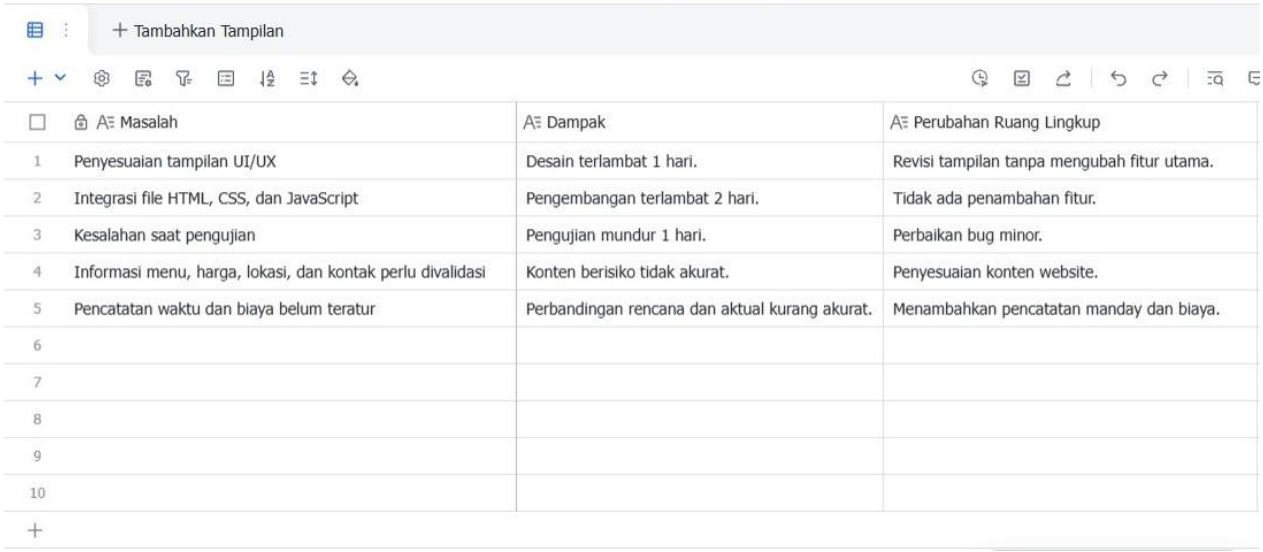

| | Masalah | Dampak | Perubahan Ruang Lingkup |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyesuaian tampilan UI/UX | Desain terlambat 1 hari. | Revisi tampilan tanpa mengubah fitur utama. |
| 2 | Integrasi file HTML, CSS, dan JavaScript | Pengembangan terlambat 2 hari. | Tidak ada penambahan fitur. |
| 3 | Kesalahan saat pengujian | Pengujian mundur 1 hari. | Perbaikan bug minor. |
| 4 | Informasi menu, harga, lokasi, dan kontak perlu divalidasi | Konten berisiko tidak akurat. | Penyesuaian konten website. |
| 5 | Pencatatan waktu dan biaya belum teratur | Perbandingan rencana dan aktual kurang akurat. | Menambahkan pencatatan manday dan biaya. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |



Gambar 4.1 Masalah Korektif

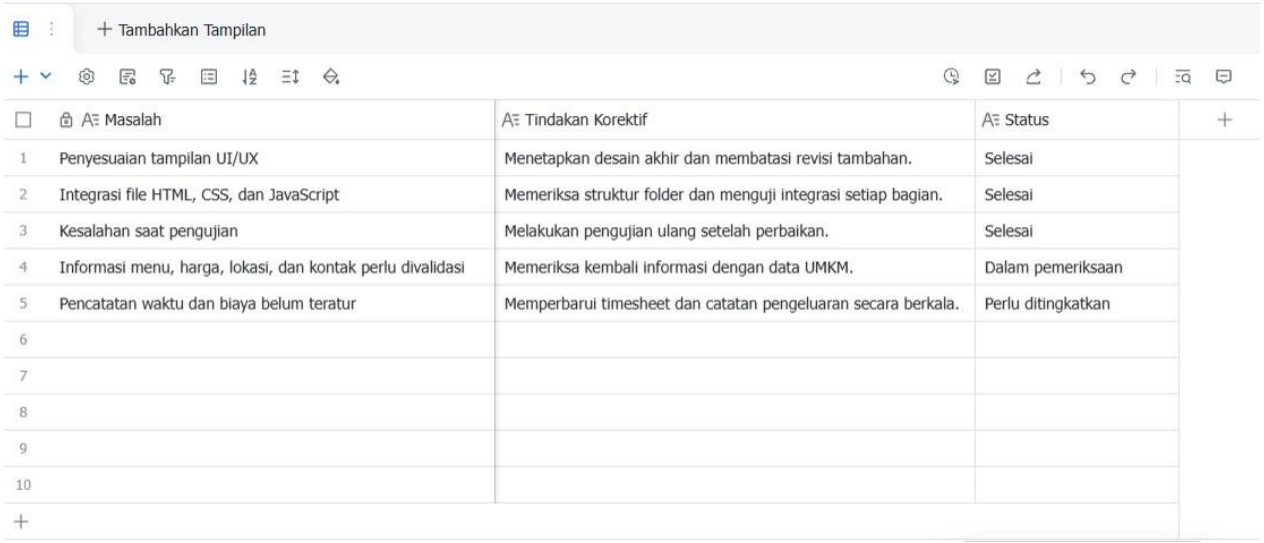

+ Tambahkan Tampilan

| | Masalah | Tindakan Korektif | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyesuaian tampilan UI/UX | Menetapkan desain akhir dan membatasi revisi tambahan. | Selesai |
| 2 | Integrasi file HTML, CSS, dan JavaScript | Memeriksa struktur folder dan menguji integrasi setiap bagian. | Selesai |
| 3 | Kesalahan saat pengujian | Melakukan pengujian ulang setelah perbaikan. | Selesai |
| 4 | Informasi menu, harga, lokasi, dan kontak perlu divalidasi | Memeriksa kembali informasi dengan data UMKM. | Dalam pemeriksaan |
| 5 | Pencatatan waktu dan biaya belum teratur | Memperbarui timesheet dan catatan pengeluaran secara berkala. | Perlu ditingkatkan |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Gambar 4.2 Masalah Korektif



+ Tambahkan Tampilan

| | Periode proyek | 21 Oktober–14 November 2026 | Periode rencana yang digunakan dalam paket evaluasi. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal evaluasi | 2026/11/13 | Evaluasi disusun per 13 November 2026. |
| 2 | Estimasi total manday | 15.75 | Manday rencana seluruh anggota. |
| 3 | Aktual total manday (si... | 16.5 | Selisih +0,75 manday atau 6 jam. |
| 4 | Anggaran rencana | 1732500 | Termasuk overhead 10%. |
| 5 | Biaya aktual (simulasi) | 1815000 | Selisih +Rp82.500 atau sekitar 4,76%. |
| 6 | Perubahan ruang lingkup | Tidak ada perubahan besar | Penyesuaian berupa revisi tampilan, perbaikan bug, dan penyempurnaan konten. |
| 7 | Catatan data | Angka aktual adalah simulasi | Ganti dengan data faktual jika timesheet dan bukti pengeluaran tersedia. |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Gambar 5. Ringkasan

10. Lampiran Link Lark dan Github

https://rjplwgak00cu.jp.larksuite.com/base/SyWObAzUKa0plOsTYjFjERVcpVb?from=from_copylink
